ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**PFTE incaricato dal Comune**	**33 g**	**13/02/2023**	**29/03/2023**	
2	redazione	30 g	13/02/2023	24/03/2023	
3	revisione	10 g	13/03/2023	24/03/2023	2FF
4	consegna ARX al Comune	1 g	27/03/2023	27/03/2023	3
5	approvazione dal Comune	1 g	28/03/2023	28/03/2023	4
6	Consegna da Comune a Casa SPA	1 g	29/03/2023	29/03/2023	5
7	**PFTE progettato da Casa SpA**	**44,13 g**	**13/02/2023**	**14/04/2023**	
8	**CASA Spa - PROGETTO**	**44,13 g**	**13/02/2023**	**14/04/2023**	
9	**Progettazione Architettonica**	**7,13 g**	**27/02/2023**	**08/03/2023**	
10	Definizione livelli	2 g	27/02/2023	28/02/2023	
11	Definizione attacco a terra	2 g	27/02/2023	01/03/2023	
12	Layout unità immobiliari interne	5 g	01/03/2023	08/03/2023	11
13	Layout locali tecnici	2 g	06/03/2023	08/03/2023	12FF
14	Aree esterne	5 g	01/03/2023	08/03/2023	11
15	**Progettazione Strutturale**	**15 g**	**01/03/2023**	**21/03/2023**	
16	Analisi geologica geotecnica	5 g	01/03/2023	07/03/2023	10
17	Concept strutturale	5 g	08/03/2023	14/03/2023	16
18	Fondazioni	5 g	15/03/2023	21/03/2023	17
19	Pilastri e travi	5 g	15/03/2023	21/03/2023	17
20	Messa in tavola del Progetto Strutturale	5 g	15/03/2023	21/03/2023	18FF;19FF
21	**Progettazione energetico - impiantistica**	**32,13 g**	**13/02/2023**	**29/03/2023**	
22	Analisi requisiti normativi DNSH e CAM 2.0	15 g	13/02/2023	03/03/2023	
23	Progettazione energetica involucro esterno	5 g	08/03/2023	15/03/2023	13;22
24	Concept Impianti di climatizzazione e ventilazione	5 g	15/03/2023	22/03/2023	22;23
25	Centrali termiche e di ventilazione	5 g	22/03/2023	29/03/2023	24
26	Cavedi distributivi	5 g	22/03/2023	29/03/2023	24
27	Fonti rinnovabili elettriche e termiche	5 g	22/03/2023	29/03/2023	24
28	Messa in tavola del Progetto Impiantistico	5 g	22/03/2023	29/03/2023	24FF;25FF;26FF;2
29	**Relazioni**	**22 g**	**08/03/2023**	**07/04/2023**	
30	Relazione generale descrittiva	5 g	08/03/2023	15/03/2023	9
31	Relazione tecnica energetica, impiantistica	5 g	29/03/2023	05/04/2023	21
32	Relazione tecnica strutturale	5 g	22/03/2023	28/03/2023	15
33	Relazione vincoli DNSH e CAM 2.0	2 g	05/04/2023	07/04/2023	31
34	**Altri documenti**	**5 g**	**07/04/2023**	**14/04/2023**	
35	Cronoprogramma e Q.E.	2 g	07/04/2023	11/04/2023	29
36	Schema funzionale di impianto meccanico	5 g	07/04/2023	14/04/2023	29
37	Schema funzionale impianto elettrico	5 g	07/04/2023	14/04/2023	29
38	**MODELLAZIONE BIM**	**29,75 g**	**01/03/2023**	**11/04/2023**	
39	**modellazione architettonica**	**15 g**	**01/03/2023**	**22/03/2023**	
40	Scatola architettonica esterna	5 g	01/03/2023	08/03/2023	11
41	Suddivisioni interne	10 g	08/03/2023	22/03/2023	12;13
42	Aree esterne	10 g	08/03/2023	22/03/2023	14
43	**modellazione strutturale**	**12 g**	**22/03/2023**	**06/04/2023**	
44	Fondazioni	12 g	22/03/2023	06/04/2023	18
45	Pilastri e travi	12 g	22/03/2023	06/04/2023	19
46	**modellazione impianti**	**9,75 g**	**29/03/2023**	**11/04/2023**	
47	Centrali termiche e di ventilazione	9 g	29/03/2023	11/04/2023	25
48	Cavedi distributivi	9 g	29/03/2023	11/04/2023	26
49	Fonti rinnovabili elettriche e termiche	7 g	31/03/2023	11/04/2023	27
50	**VERIFICA LC3 e eventuali piccole SISTEMAZIONI**	**5 g**	**11/04/2023**	**18/04/2023**	**48;49**
51	**verifica e approvazione Casa SPA**	**12 g**	**04/04/2023**	**20/04/2023**	
52	verifica ex art. 26 dl 50/16	10 g	04/04/2023	18/04/2023	50FI-10 g
53	approvazione	1 g	18/04/2023	19/04/2023	52
54	trasmissione al comune di calenzano del progetto definiti	1 g	19/04/2023	20/04/2023	53
55	**attività amministrativa**	**47 g**	**20/04/2023**	**26/06/2023**	**54**
56	convocazione della conferenza di servizi	45 g	20/04/2023	22/06/2023	
57	conferenza di serivi	1 g	22/06/2023	23/06/2023	56
58	approvazione in giunta	1 g	23/06/2023	26/06/2023	57
59	**procedura affidamento Casa Spa**	**4,13 g**	**26/06/2023**	**30/06/2023**	
60	invio a casa spa dell'approvazione	1 g	26/06/2023	27/06/2023	58
61	validazione	1 g	27/06/2023	28/06/2023	60
62	approvazione	1 g	28/06/2023	29/06/2023	61
63	lancio gara	0,88 g	30/06/2023	30/06/2023	

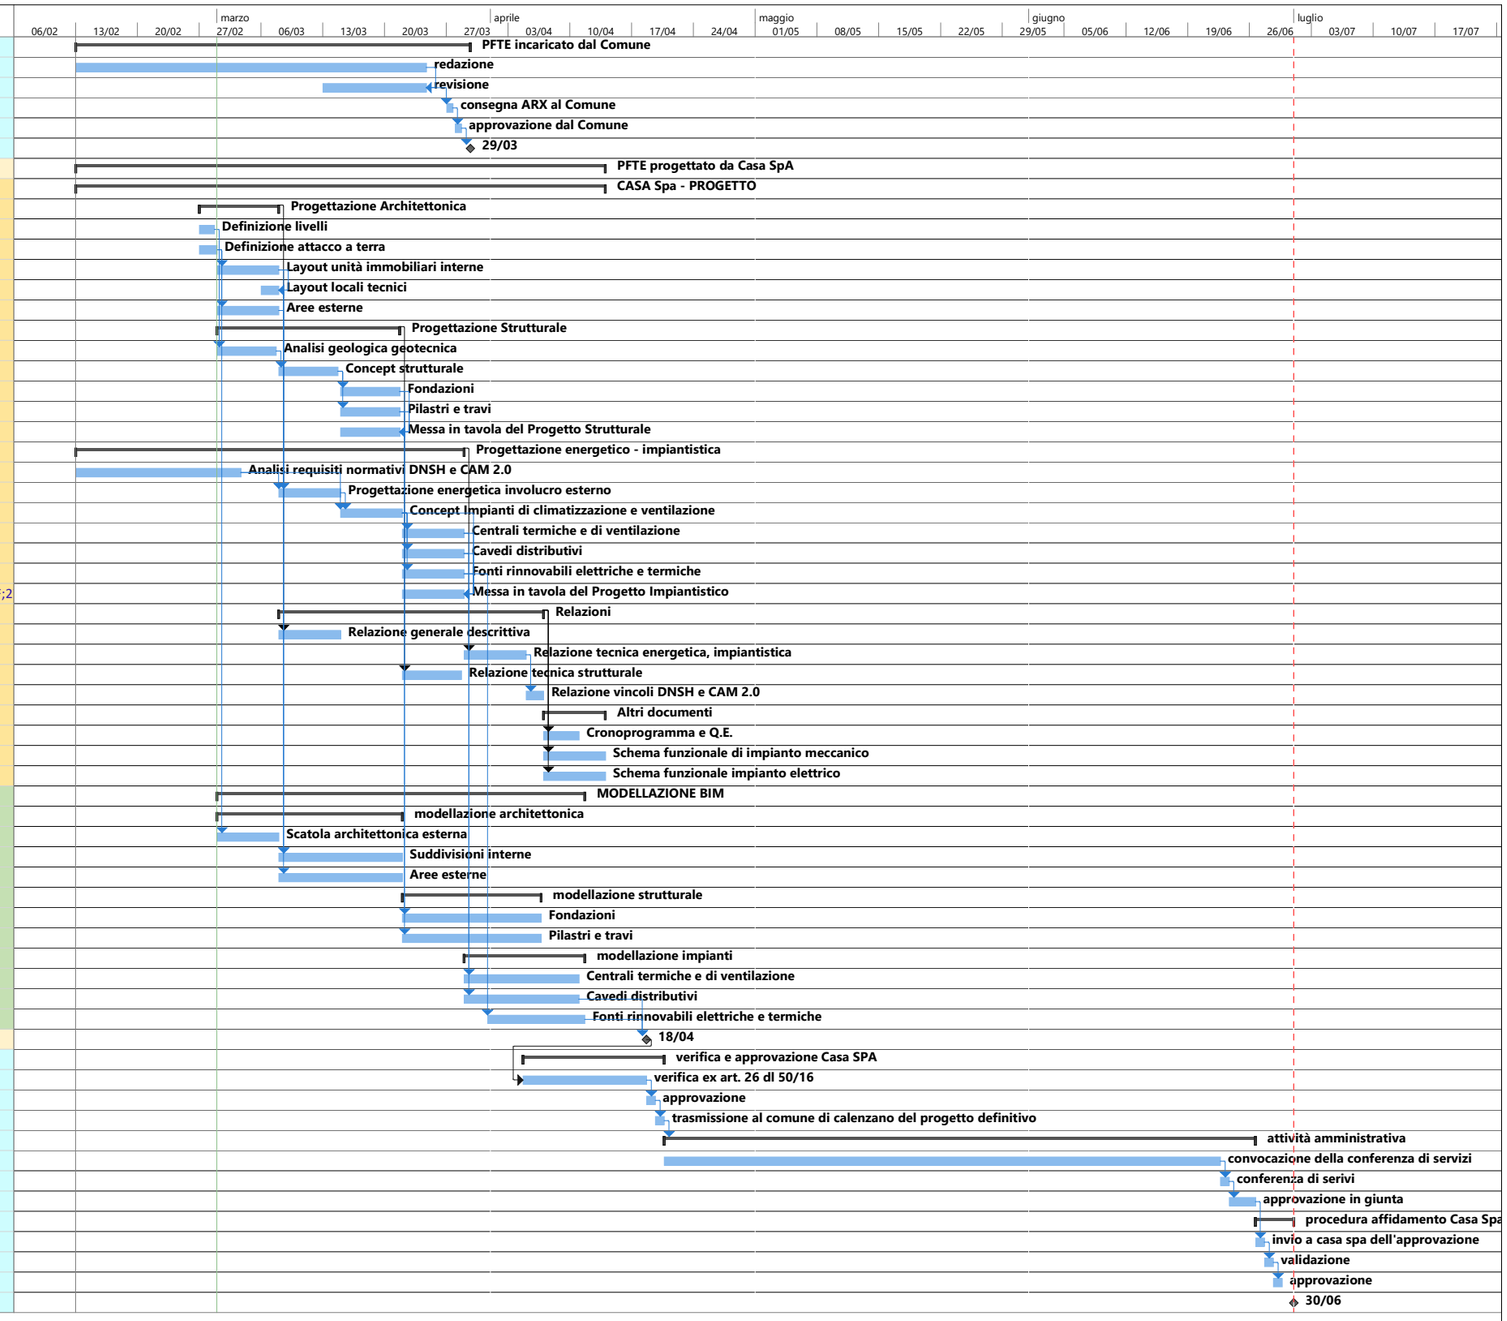

Progetto: CASA Spa
Data: 01/03/2023

Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività inattiva · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo-fine · Attività esterne · Cardine esterno · Scadenza · Critica · Divisione critica · Avanzamento · Avanzamento manuale
